CENTRO ESCOLAR CEICAVS — SERVICIO SOCIAL

Gestión de Tickets y Planificación de Sprints

Evidencia del proceso de asignación de tareas, seguimiento de sprints y cadena de dependencias usando Linear

Proyecto: Sistema Escolar CEICAVS

Herramienta: Linear (Gestión de Proyectos) **Equipo:** ceicavs-team **Responsable:** Francisco Josue Hernandez **Período:** 14 Abr — 8 Jun 2025 **Fecha:** Abril 2025

Gestión de Tickets con Linear

Este documento presenta la evidencia del proceso de planificación y gestión de tareas del proyecto CEICAVS utilizando Linear como herramienta de seguimiento. Se documentan los 35 tickets creados, su organización en 6 proyectos domínio, la planificación en 4 sprints, la cadena de dependencias y el proceso de asignación de responsabilidades.

1. Estructura del Workspace

1.1 Organización por Proyectos

El backlog completo del sistema fue organizado en **6 proyectos temáticos** que representan los dominios funcionales del sistema. Esta estructura permite filtrar y visualizar el progreso de cada área de forma independiente.

PROYECTO	DOMINIO	TICKETS	PRIORIDAD
Auth & Users	Autenticación, perfiles, CASL	SOL-10 a SOL-13, SOL-41 a SOL-45	ALTA
Attendance	Registro y reportes de asistencia	SOL-14 a SOL-19	MEDIA
Blog & Posts	Feed, publicaciones, comentarios	SOL-28 a SOL-35	MEDIA
Learning Tools	Herramientas educativas digitales	SOL-20 a SOL-27	MEDIA
AI Transcription	Grabaciones y transcripción con IA	SOL-36 a SOL-40	MEDIA
Admin	Dashboard y gestión de usuarios/grupos	SOL-41 a SOL-45	NORMAL

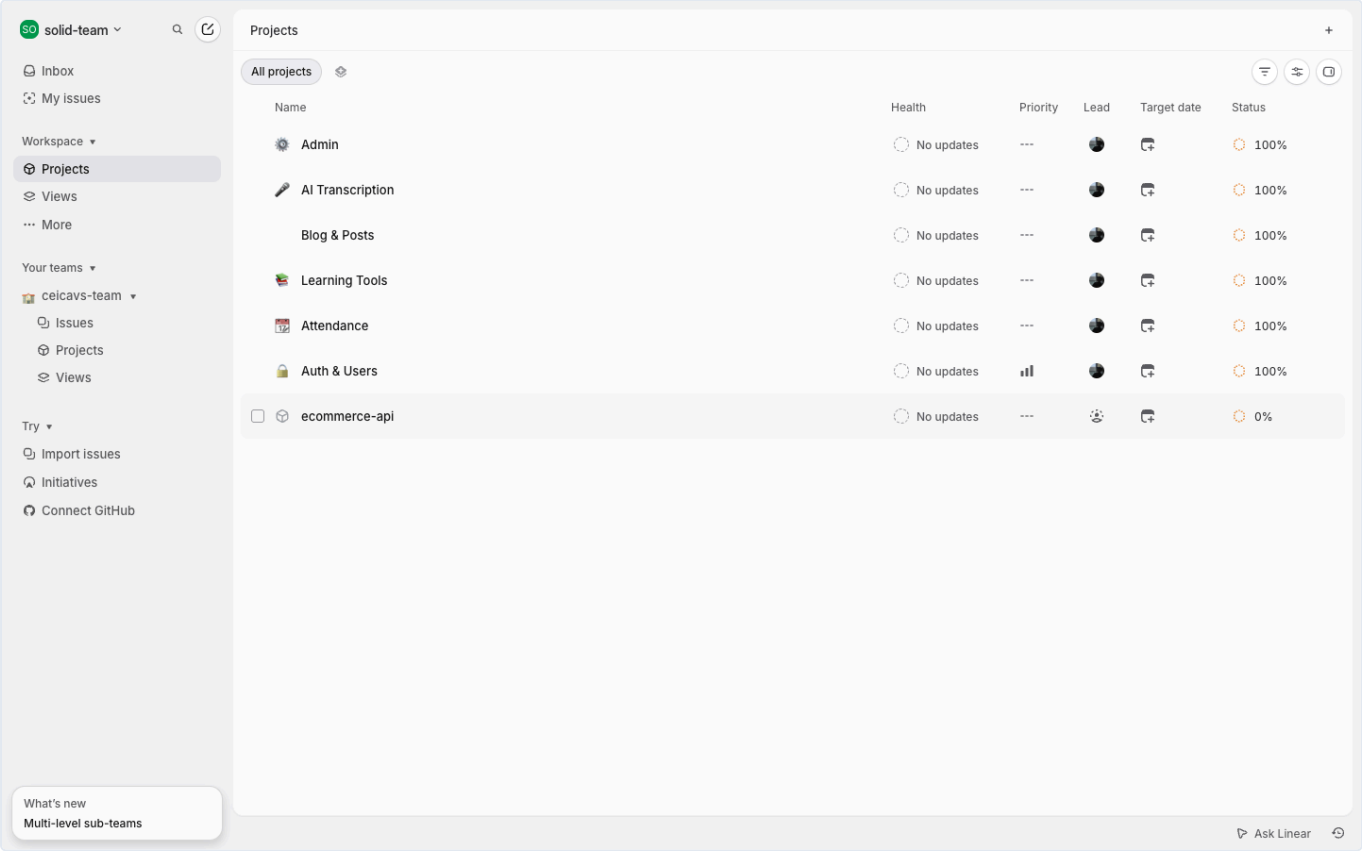

Vista de los 6 proyectos del workspace con su estado y porcentaje de completitud

2. Inventario Completo de Tickets

2.1 Vista General — All Issues

Se crearon **35 historias de usuario** (SOL-10 a SOL-45), todas asignadas al responsable del proyecto y marcadas como **Done** al momento del inventario inicial. Cada ticket incluye criterios de aceptación, proyecto asignado, milestone de sprint y dependencias bloqueantes.

2.2 Asignación de Responsabilidades

Todos los tickets fueron asignados a **Francisco Josue Hernandez** como responsable técnico único del proyecto de servicio social. La vista "My Issues" muestra el conjunto completo de tareas bajo esta asignación.

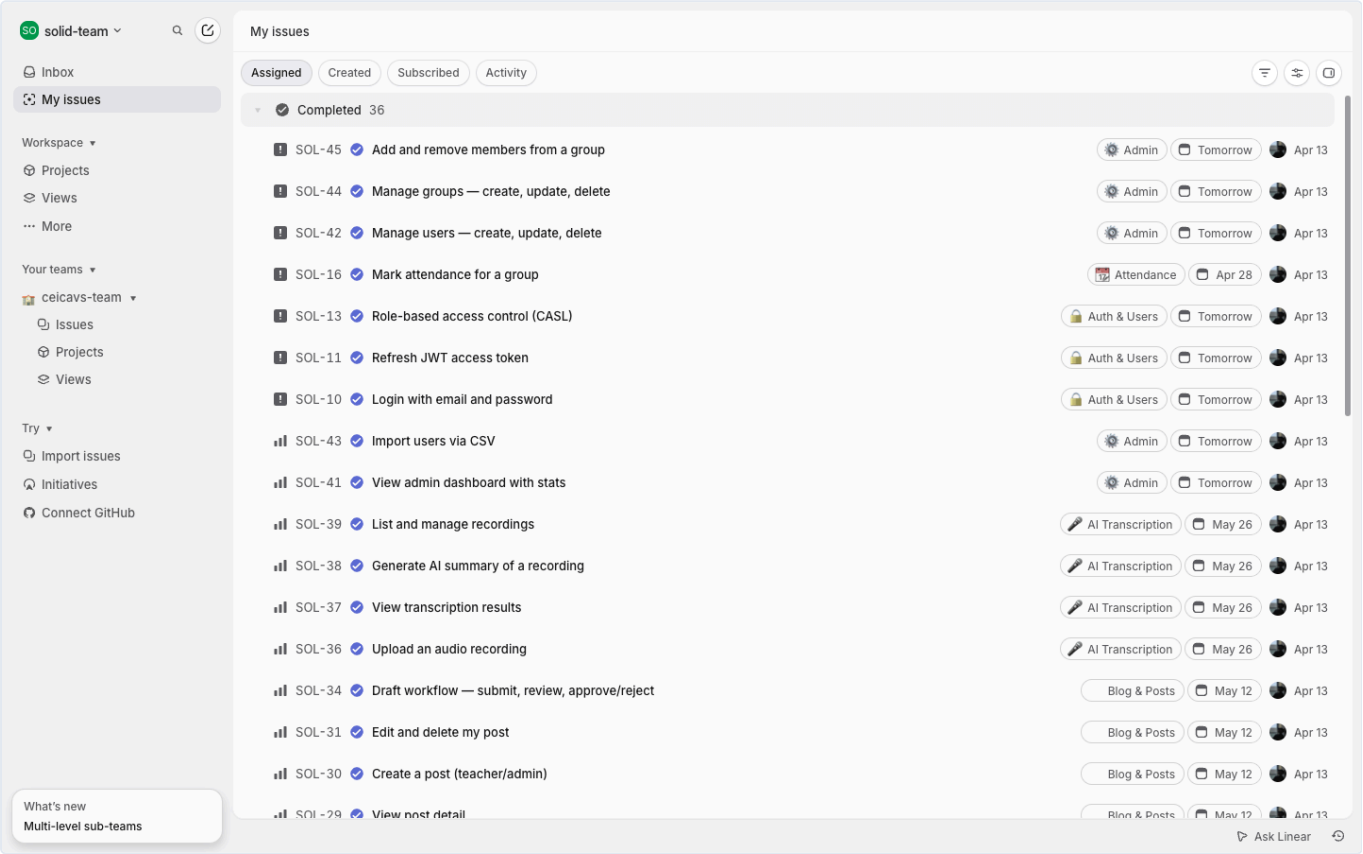

Vista "My Issues" mostrando los 35 tickets asignados al responsable del proyecto

3. Planificación de Sprints

3.1 Estructura de Milestones

El proyecto se dividió en **4 sprints de 2 semanas**, cada uno representado como un milestone en Linear. Los milestones definen las fechas límite y agrupan los tickets correspondientes a cada fase de desarrollo.

SPRINT	NOMBRE	PERÍODO	ENFOQUE
SPRINT 1	Foundation: Auth	14 Abr — 27 Abr	Autenticación, JWT, CASL, Dashboard Admin, Gestión de Usuarios y Grupos
SPRINT 2	Core Features: Attendance	28 Abr — 11 May	Vista de grupos, roster, registro de asistencia, reportes y exportación
SPRINT 3	Content: Blog & Posts	12 May — 25 May	Feed del blog, publicaciones, comentarios, reacciones, cola de revisión
SPRINT 4	Tools & AI Recordings	26 May — 8 Jun	Herramientas educativas, grabación de audio, transcripción con IA

3.2 Evidencia de Milestone en Proyecto

Cada proyecto registra su milestone de sprint asociado. La imagen siguiente muestra el proyecto **Attendance** con su milestone "Sprint 2 — Core Features" asignado, su descripción funcional y el porcentaje de avance.

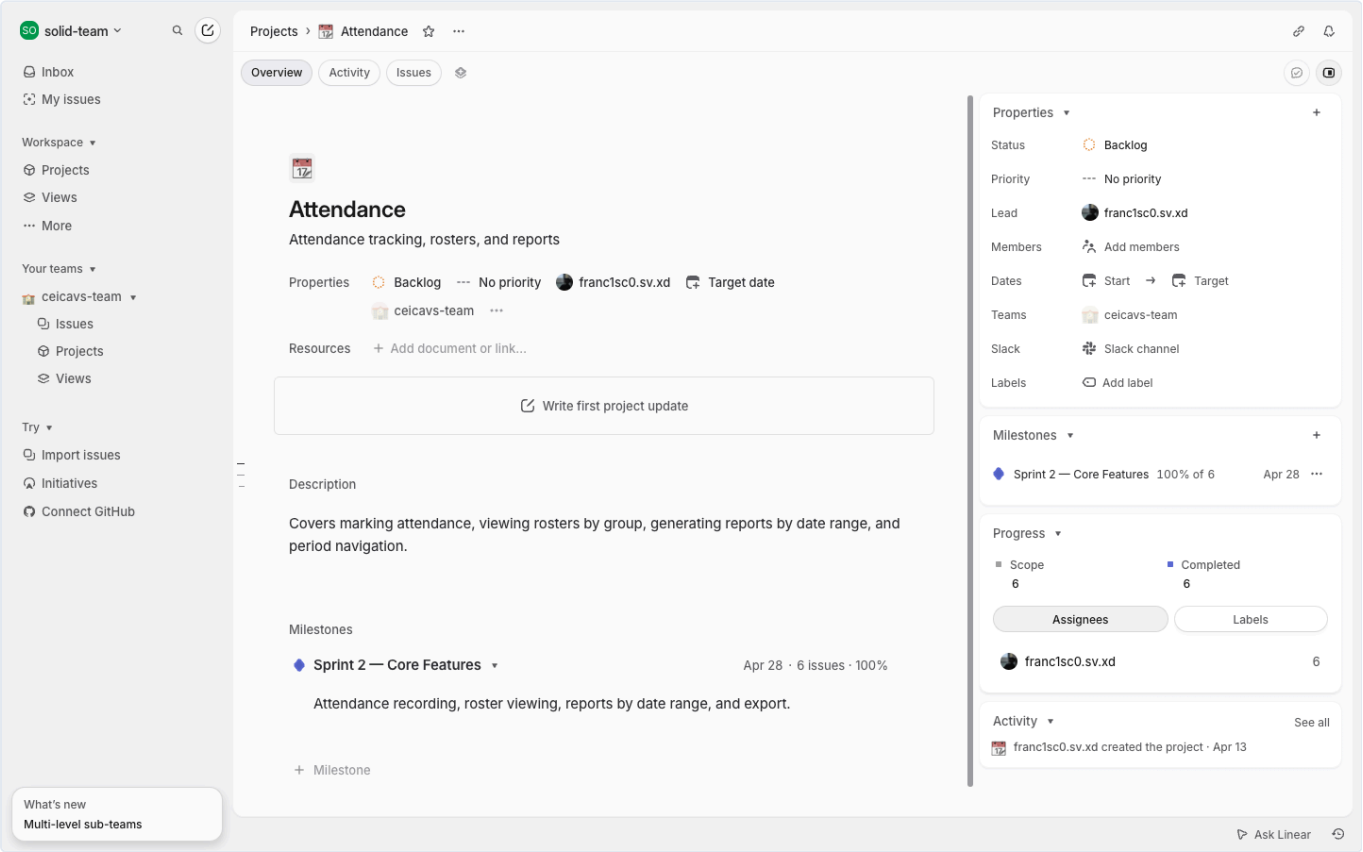

Proyecto Attendance con milestone Sprint 2, descripción, miembro asignado y estado al 100%

4. Detalle de Tickets por Área

4.1 Ticket Raíz — Autenticación (SOL-10)

SOL-10 es el ticket raíz de toda la cadena de dependencias. Contiene criterios de aceptación detallados, el historial de cambios de estado y un comentario de auditoría que documenta su rol en la arquitectura del sistema. Todos los demás tickets dependen (directa o indirectamente) de este ticket.

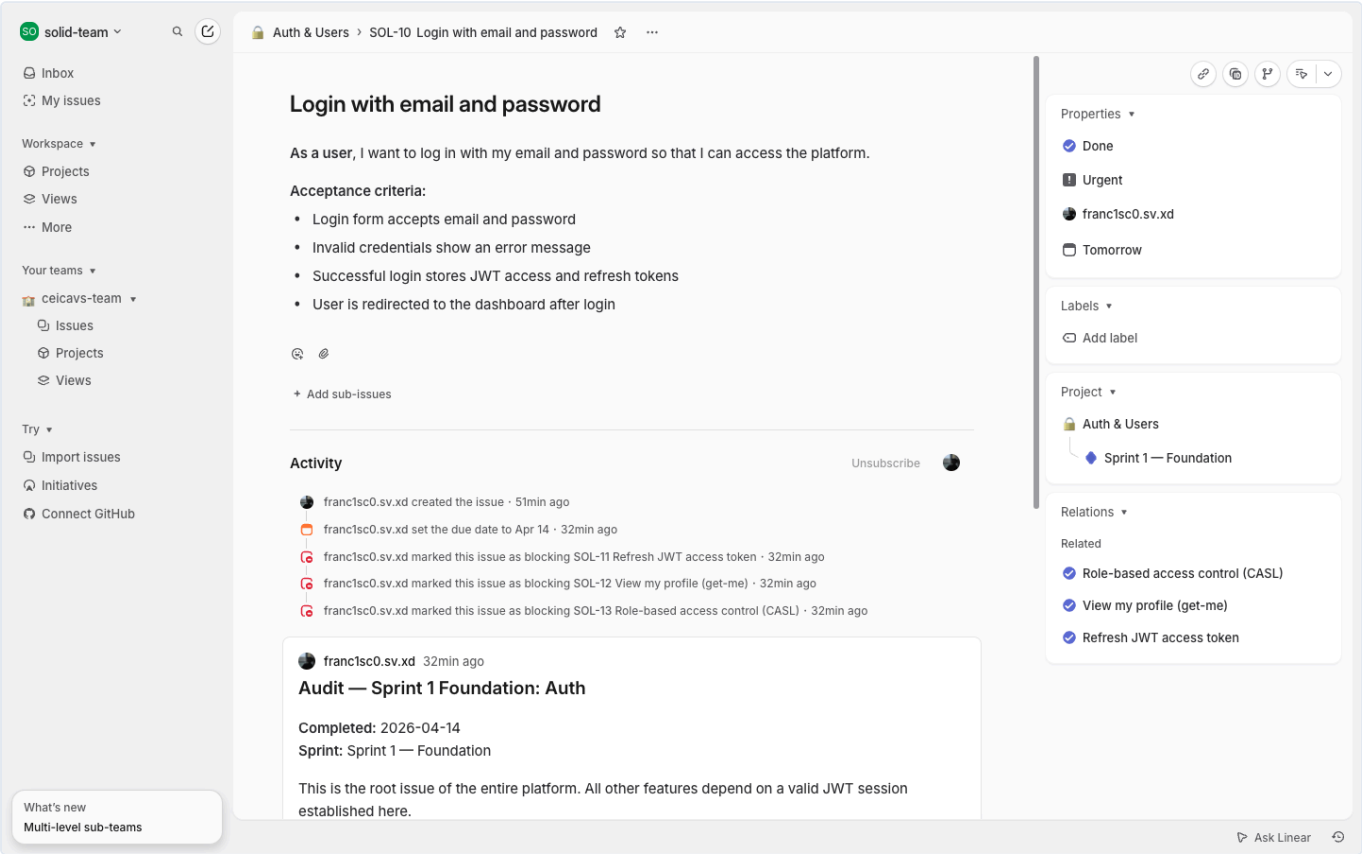

SOL-10: Login con email y contraseña — ticket raíz con criterios de aceptación y comentario de auditoría Sprint 1

4.2 Módulo de Asistencia (SOL-16)

SOL-16 representa la operación transaccional central del módulo de asistencia. El ticket registra su milestone de Sprint 2, la cadena de tickets bloqueados por él (reportes, exportación, historial) y el comentario de auditoría con las dependencias técnicas.

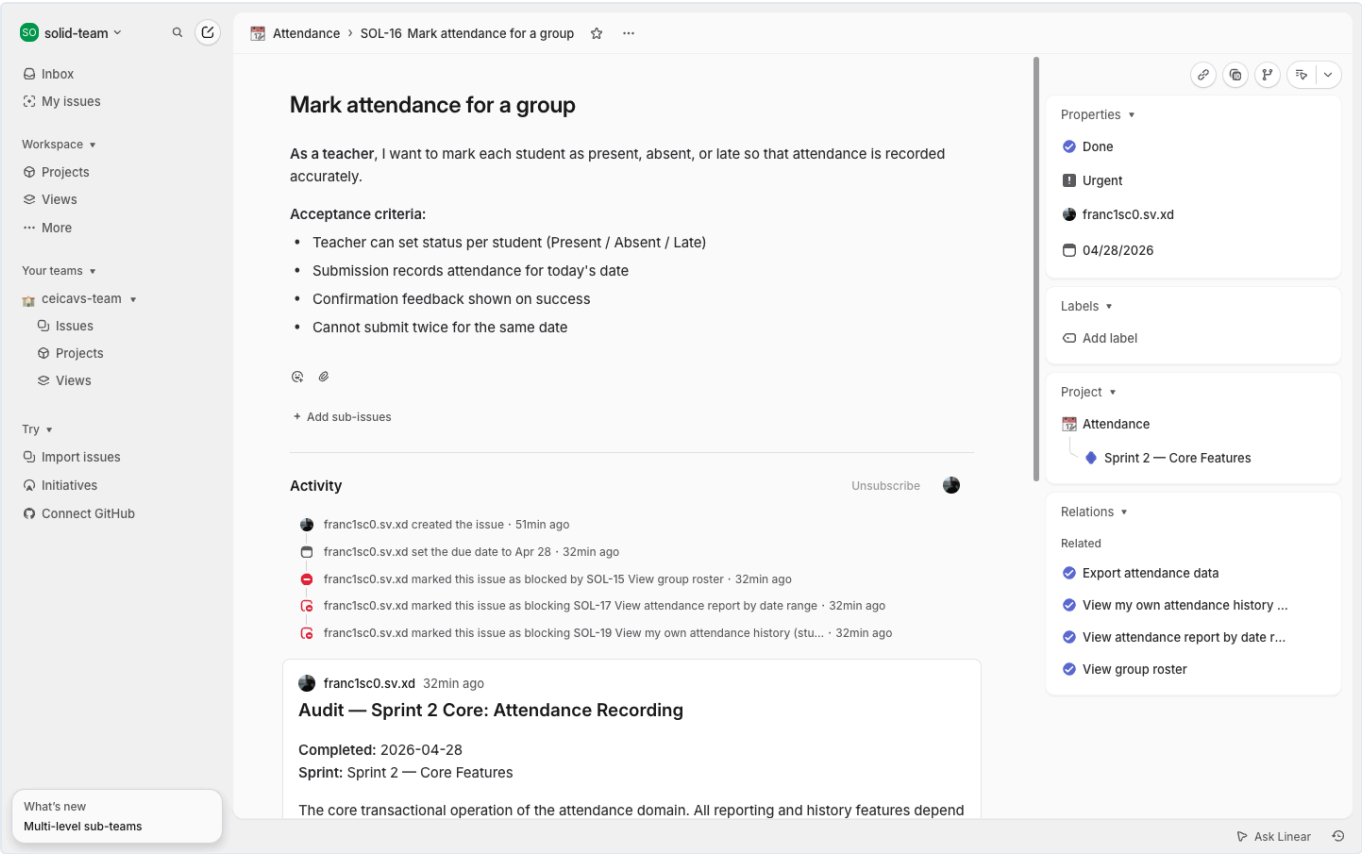

SOL-16: Marcar asistencia para un grupo — milestone Sprint 2 y auditoría del módulo de asistencia

4.3 Gestión de Usuarios (SOL-42)

SOL-42 cubre el CRUD completo de usuarios desde el panel de administración. El ticket está asignado al Sprint 1 y es bloqueante para la importación CSV (SOL-43), ya que la estructura de usuarios debe existir antes de importar en masa.

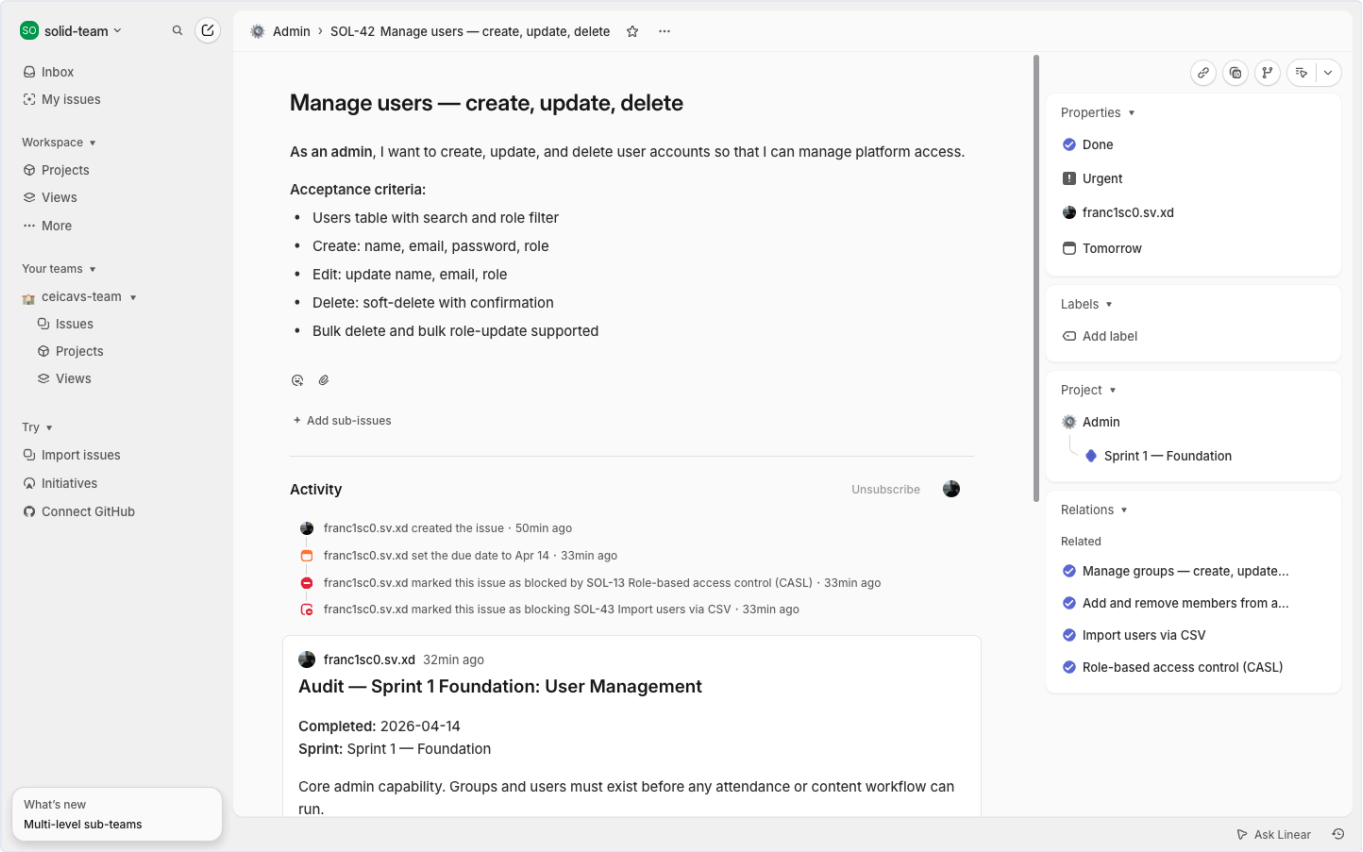

SOL-42: Gestionar usuarios — milestone Sprint 1 Foundation y comentario de auditoría de gestión de usuarios

4.4 Transcripción con IA (SOL-36)

SOL-36 inicia el flujo del módulo de grabaciones. Depende de CASL (SOL-13) para el control de acceso y es bloqueante para el proceso de transcripción (SOL-37), generación de resumen IA (SOL-38), listado (SOL-39) y reproducción (SOL-40).

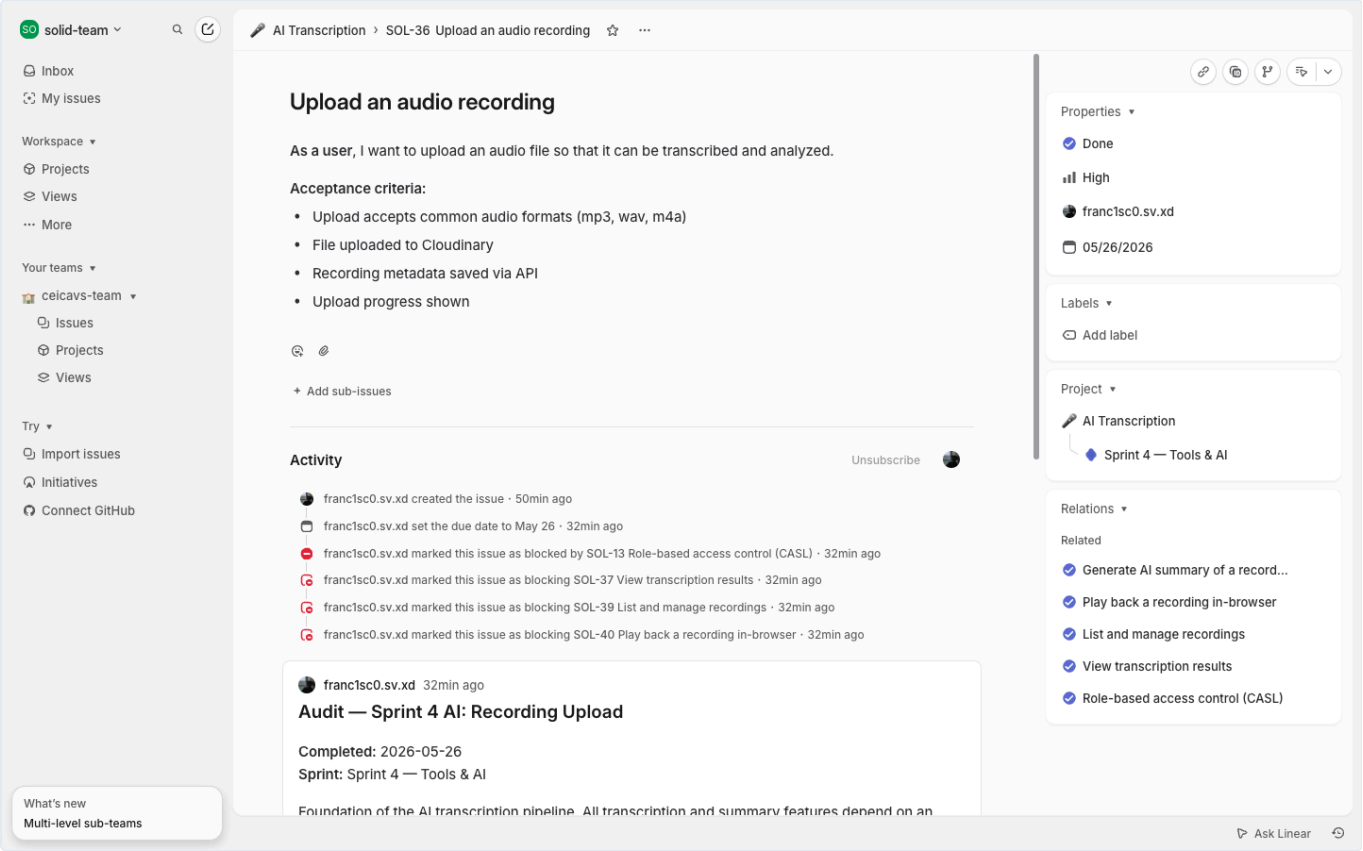

SOL-36: Subir grabación de audio — milestone Sprint 4 y auditoría del módulo de transcripción con IA

5. Cadena de Dependencias (Blocker Chain)

Se estableció una cadena de dependencias lógica entre todos los tickets para representar fielmente el orden real de implementación. SOL-10 es el único ticket sin bloqueantes previos; todos los demás tickets tienen al menos un ticket que los bloquea.

> **PRINCIPIO DE DISEÑO DE LAS DEPENDENCIAS**
> Las dependencias reflejan orden arquitectónico real: ningún módulo puede operar sin autenticación (SOL-10) ni sin control de acceso (SOL-13). Dentro de cada dominio, las operaciones de escritura bloquean a las de lectura y exportación.

TICKET	TÍTULO	BLOQUEADO POR	BLOQUEA A
SOL-10	Login con email y contraseña	— (raíz)	SOL-11, SOL-12, SOL-13
SOL-13	Control de acceso basado en roles (CASL)	SOL-10	SOL-41, SOL-42, SOL-44, SOL-35, SOL-28, SOL-20, SOL-36
SOL-16	Marcar asistencia para un grupo	SOL-15	SOL-17, SOL-18, SOL-19
SOL-30	Crear publicación de blog	SOL-35	SOL-31, SOL-34
SOL-36	Subir grabación de audio	SOL-13	SOL-37, SOL-38, SOL-39, SOL-40
SOL-42	Gestionar usuarios	SOL-13	SOL-43

6. Metodología de Auditoría

Se agregaron **comentarios de auditoría** en los 6 tickets ancla (SOL-10, SOL-16, SOL-30, SOL-36, SOL-42, SOL-20) para documentar:

- Fecha de completación del módulo
- Sprint al que pertenece
- Cadena de dependencias descendentes
- Notas técnicas de implementación

> **USO DE LINEAR COMO HERRAMIENTA DE TEAM LEAD**
> La estructura implementada en Linear permite a cualquier nuevo miembro del equipo entender el orden de implementación, las dependencias entre módulos, el propietario de cada tarea y el sprint de entrega simplemente navegando el backlog. Los comentarios de auditoría sirven como documentación viva del proceso de desarrollo.

35
Tickets creados
6
Proyectos domínio
4
Sprints planificados
100%
Tickets completados
